

Møte:	Avsluttende møte med deltakere i medvirkningsgruppen – B2 (midlertidig hovedinngang og prøvetaking)	Prosjekt:	Rokade C1
Møtedato:	12.05.23	Sted:	Bergvillaen RH
Referent:	Thea Ekren Koren		

Møtedato: 12.05.2023 09:00

Plassering: Bergvillaen RH

Invitasjonsmelding

Nå med Teams mulighet, men vi ønsker fysisk deltakelse der det er mulig

Hei

Dere har medvirket i Rokade C1 på ovennevnte delprosjekt.

Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Dere inviteres i denne forbindelse til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

Agenda:

- Gi status for delprosjektet*
- Oppsummere aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring.*

Vel møtt

Deltakere (Skjul)

[Stian Ilebrekke](#) (Møtearrangør), deltok
[Johanne Lovise Holstad](#), deltok på Teams
[Guro Myrvold Funjem](#), deltok, seksjonsleder Deichman OUS,
Rikshospitalet
[Espen Joakim Engen](#), deltok
[Vidar Arnesen](#)
[Anders Halden](#)
[Ole Andreas Gresholt](#), deltok TV NITO, KLM
[Anne Gro Valla](#), VO, deltok på Teams
[Aksel Einar Halvorseth](#)
[Poul Løvgreen Stensby](#)
[Henning Mathisen](#)
[Øivind Skotland \(HLF Oslo Nord-Øst\)](#), deltok,
brukerrepresentant, brukerutvalg OUS
[Liv Inger Homleid-Helland](#)
[Nina Eriksen](#)
[Egil Lingaas](#), deltok, smittevern OUS
[Gry Eirin Strand](#), leder byggeplass koordinering OUS, deltok
på Teams
[Jan Sørflaten-Thuen](#)
[Ida Helene Morgenstjerne Skard Heier](#), deltok
[Randi Bergersen](#)
[Erlend Franz Solvang](#), prosjektleder, deltok
[Koren, Thea](#), HSØ PO, referent, deltok
Bjørn Aage Feet, Programleder NRH, Nye OUS, deltok
[Per Oddvar Synnes](#), prosjektverneombud OUS, deltok
[Michael Geyer](#) | Arkitekt, deltok
Martin Lieungh, fagkoordinator, Nye OUS, deltok
[Kevin Angel](#), portør TV, deltok
Gergely Jászay, arkitekt, deltok
Simona Ferrari, arkitekt, deltok på Teams

Referat fra møtet

Sak 1 Oppsummere status for delprosjektet i Rokade C1

Velkommen til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

- Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
- Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet.
- OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen.

Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Det ble gitt informasjon om de endringer i medvirkning/samhandlingsansvar som er overført fra OUS til HSØ PO.

Prosjektleder Erlend Franz Solvang, sammen med arkitekter fra prosjekteringsgruppen oppsummerte og presenterte funksjonsområdene.

Følgende medvirkning er gjennomført for prosjektet:

31.08.2021 - Brukermøte Pasientbibliotek og LMS

15.09.2021 - Brukermøte Prestetjenesten

23.09.2021 - Brukermøte Pasientbibliotek

12.10.2021 - Brukermøte Prøvemottak

28.10.2021 - Brukergruppemøte

05.11.2021 - Brukermøte Renhold

24.11.2021 - Brukermøte Prøvemottak

08.12.2021 - Brukermøte Prøvemottak

Uformelle avklaringsmøter og befaringer med berørte klinikker og enheter står ikke oppført.

Delprosjektet omhandler funksjoner fordelt på to faser.

Fase 1 primo 2025:

1. Midlertidig hovedinngang med nærliggende støttefunksjoner:

- Kontor, resepsjon og kontrollrom for sikkerhet
 - Pasientbibliotek
 - Læring & Mestring
 - Kiosk
 - Automatkantine
 - Rullestollager
 - Venterom portør
 - Vestibyle (ca 340 kvm)
2. Prøvetaking
- 8 stk Ordinære prøvetakingsrom
 - 2 stk Hempol prøvetakingsrom
 - 1 stk Smitte prøvetakingsrom
 - LAB
 - Ventesone (ca 100 kvm)


Fase 2 – Når Nye RH ferdigstilles (år 2031):

1. Prøvemottak
- 21 stk Ordinære prøvetakingsrom (+ 13 fra Ullevål)
 - 2 stk Hempol prøvetakingsrom
 - 1 stk Smitte prøvetakingsrom
 - LAB
 - Ventesone (ca 250 kvm)
2. Disponibelt areal ca. 230 kvm

Tegninger og modell ble presentert og gjennomgått i møtet:



Bilde 1 - Fase 1 Prøvetaking og midlertidig hovedinngang, bygg B2 plan 01

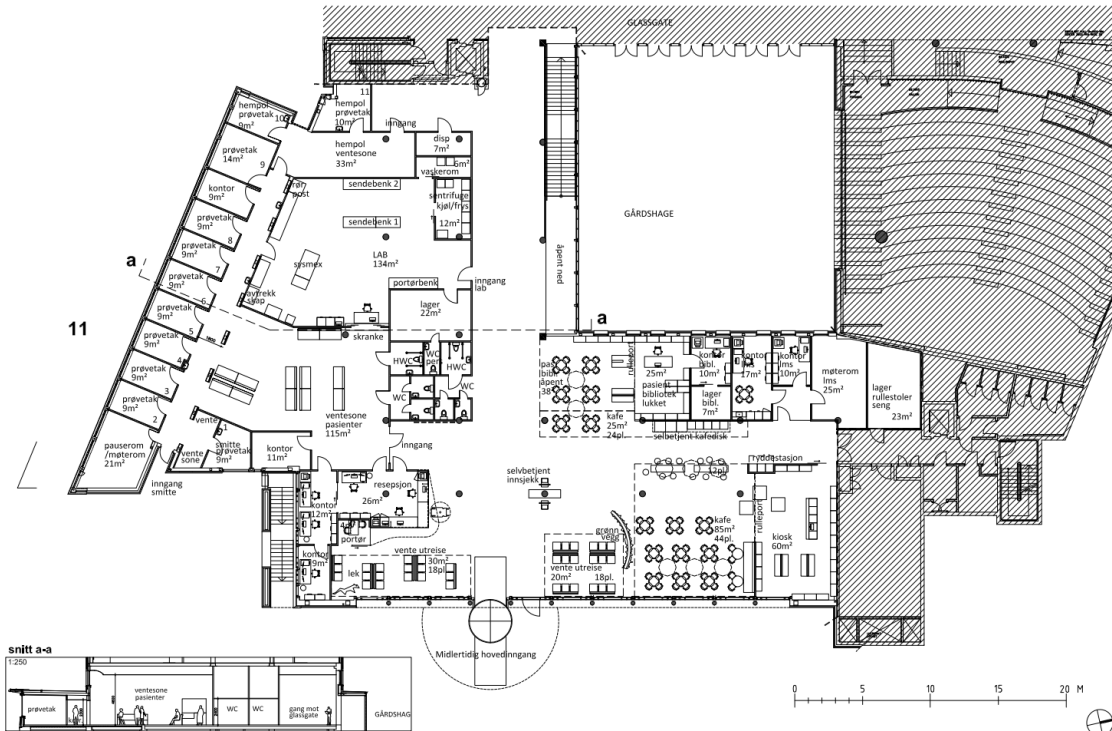

Ratio

DP1-3 SKISSE A01
REV. 16.12.21 | MG

PRØVETAKING
FASE 1

OUS RIKSHOSPITALET | KONSEPTUTREDNING ROKADE C1, DP1-3
OMBYGGING BYGN.AVSN. B2, 1. ETG.


MAL: 1:200 (A3) | 26.10.21

Deltakere i møtet gav innspill til prosess og status. Det ble gitt informasjon fra vernetjenesten at de har jobbet godt i prosessen med å lage løsninger som ivaretar risikoreduserende tiltak jfr. vold, trusler og sikkerhet for ansatte og besøkende. Vernetjenesten sa de var fornøyde med løsningene og at de har deltatt i medvirkning. Funksjonsområdet ivaretar for inngangsområdet ca. samme antall plasser i midlertidig området som i eksisterende løsning. Det er jobbet med lydkrav, akustikk osv. og det foreligger lydplaner og tiltak er planlagt jfr. materialvalg og andre tiltak i området.

I området for prøvetaking er det planlagt flere innganger, og ekspedisjon er planlagt samlet i kjernen. Det er planlagt gjenbruk av eksisterende kontorer som omgjøres til prøvetakingsrom, dører, vegger og vinduer gjenbrukes og endres ikke, (dørbredder, lydkrav osv, sjekkes ut). Det er planlagt for servanter 3 stykker i korridorområdet utenfor prøvetakingsrommene. (Det blir i møtet gitt innspill om ønske om servant i prøvetakingsrom for hematologiske pasienter og smitterommet.) Det ble presentert løsninger for støttefunksjoner til ansatte, pasienter og besøkende med toaletter, lager, personalfunksjoner osv.

I underetasje er det planlagt for støttefunksjoner med avfallsrom, teknisk rom til dialyse, bokmagasin og lager for kiosk.

Bilde 2 - Fase 2 mulighet for utvidet område for prøvetaking, bygg B2, plan 01

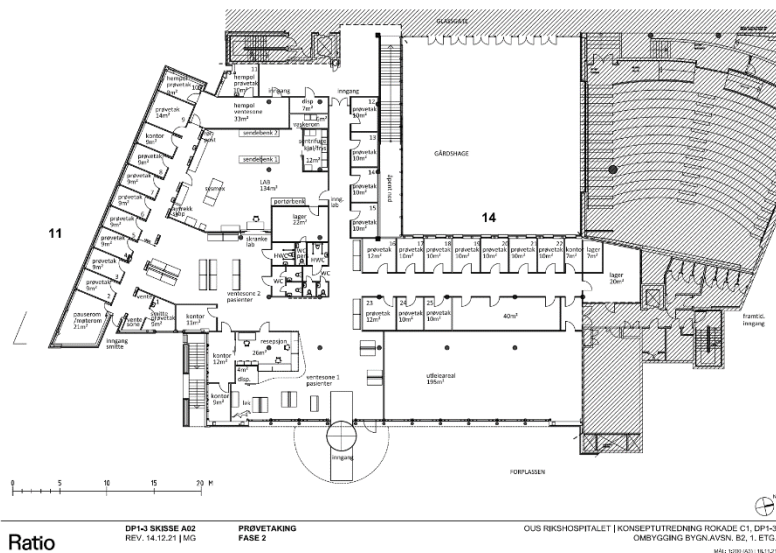

Det ble presentert at løsning for OUS med å utvide prøvetaking er gjennomførbart i fase 2. Det vil også være disponibelt areal for andre funksjoner i området.

Klinikkontaktene er Nye OUS sitt kontaktpunkt inn mot den enkelte klinikk. Deltakere til en overordnet medvirkningsgruppe og særgrupper innen enkelte delprosjekter vil bli innmeldt etter samme mal som i forprosjektet. Ytterligere behov for kontaktpunkter inn mot den enkelte klinikk etableres via Nye OUS og klinikkontaktene. Medvirkning via de brukergrupper som ble benyttet i forprosjektet, er avsluttet.

Fremdriftsplan ble presentert og arbeidet skal påbegynnes april 2024 og skal være klart for bruk senest desember 2024. Det er planlagt å sende søknad for arbeidet senest september 2023. Rokadeprojektet har egen tabelloversikt som viser planer for de ulike søknadsprosessene som er del av prosjektets fremdriftsplan.

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2023												2024												2025					
					f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	f	m						
81	Avtale 5: Ombygging av B2 - Generalentreprise, åpen anbudskonkurranse	453 d	01.02.23	26.12.24	[Gantt chart showing project schedule from Feb 2023 to Dec 2024]																													
82	Prosjektering til ferdig TFK	65 d	01.02.23	03.05.23	[Gantt chart showing project schedule from Feb 2023 to May 2023]																													
83	TFK	15 d	03.05.23	24.05.23	[Gantt chart showing project schedule from May 2023 to May 2023]																													
84	Byggsøknad B2, 4. etg. (Dialyse, nyrelab)	60 d	24.05.23	13.09.23	[Gantt chart showing project schedule from May 2023 to Sep 2023]																													
85	Utarbeide lse av NS3420 beskrivelse (ferdig kvalitetssikret G-prog)	15 d	24.05.23	14.06.23	[Gantt chart showing project schedule from May 2023 to Jun 2023]																													
86	Sammenstilling og KS av underlaget (Ratio og BH)	10 d	14.06.23	28.06.23	[Gantt chart showing project schedule from Jun 2023 to Jun 2023]																													
87	Kunngjøringstidspunkt (sende til Doffin)	0 d	28.06.23	28.06.23	[Gantt chart showing project schedule from Jun 2023 to Jun 2023]																													
88	Regningsperiode entreprenør	35 d	28.06.23	14.09.23	[Gantt chart showing project schedule from Jun 2023 to Sep 2023]																													
89	Tilbud inn	0 d	14.09.23	14.09.23	[Gantt chart showing project schedule from Sep 2023 to Sep 2023]																													
90	Evaluering BH	15 d	14.09.23	05.10.23	[Gantt chart showing project schedule from Sep 2023 to Oct 2023]																													
91	Tildeling	0 d	05.10.23	05.10.23	[Gantt chart showing project schedule from Oct 2023 to Oct 2023]																													
92	Kontraktsinnngåelse	0 d	19.10.23	19.10.23	[Gantt chart showing project schedule from Oct 2023 to Oct 2023]																													
93	Igangssettingstillatelse B2, 4. etg. (Dialyse, nyrelab)	20 d	14.09.23	11.10.23	[Gantt chart showing project schedule from Sep 2023 to Oct 2023]																													
94	Arbeidstegninger B2, 4. etg. (Dialyse, nyrelab) inkl TFK	50 d	07.08.23	13.10.23	[Gantt chart showing project schedule from Aug 2023 to Oct 2023]																													
95	Planleggingsfase entreprenør	35 d	19.10.23	07.12.23	[Gantt chart showing project schedule from Oct 2023 to Dec 2023]																													
96	Bygging B2, 4. etg. (Dialyse, nyrelab)	140 d	07.12.23	20.06.24	[Gantt chart showing project schedule from Dec 2023 to Jun 2024]																													
97	Testing og ferdigstillelse av dialyse	45 d	20.06.24	24.09.24	[Gantt chart showing project schedule from Jun 2024 to Sep 2024]																													
98	Bygge søknad øvrige arealer	60 d	19.09.23	12.12.23	[Gantt chart showing project schedule from Sep 2023 to Dec 2023]																													
99	Igangssettingstillatelse øvrige arealer	20 d	12.12.23	08.01.24	[Gantt chart showing project schedule from Dec 2023 to Jan 2024]																													
100	Arbeidstegninger øvrige arealer inkl TFK	100 d	07.08.23	22.12.23	[Gantt chart showing project schedule from Aug 2023 to Dec 2023]																													
101	Bygging øvrige arealer	170 d	02.04.24	26.12.24	[Gantt chart showing project schedule from Apr 2024 to Dec 2024]																													

Sak 2 Oppsummering av aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring

- Døren til midlertidig hovedinngang er ikke avklart, pågår koordinering og avklaringer slik at det som er planlagt på innsiden av bygget og presentert i møtet, må henge sammen med terreng og funksjonskrav som skal være på utsiden av den midlertidige hovedinngangen. Egen prosess for dette pågår og det er planlagt medvirkningsprosess for midlertidig forplass 2 utomhus.
- Brukerrepresentanten som har vært i gruppen har det skjedd noe med i forhold til e-postadresse, det avtales derfor sær møte med brukerrepresentanten så deres innspill til prosessen blir gjennomgått. Ansvar Nye OUS i samarbeid med HSØ PO.
- Underlaget sjekkes ut i forhold til arbeidsmiljøavdelingen i OUS.
- Dørene til prøvetakingsrommene er planlagt gjenbrukt og de har lydkrav som ivaretar kravene. Funksjonskravene sjekkes ut og ivaretas i videre detaljprosjektering. Prosjekteringsgruppe avklarer sammen med prosjektledelse og Nye OUS.
