

NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

H - OPERASJON



NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

H - OPERASJON

Rom gjennomgått i møte 1, 3 og særmøter				
Romnr	Romnavn	Møte 1	Møte 2	Særmøter
08.01.068	Laboratorium, preparatrom	X		X
08.01.038	Desinfeksjonsrom	X		
08.01.021	Operasjon	X		X
08.01.018	Operasjon, ortopedi	X		X
08.01.106	Arbeidsstasjon, kommandosentral	X		
08.01.122	Møterom	X		

Det har vært en større rokade på sammedagsmottaket som har påvirket operasjon. Videre har medvirkningsmøte nr 3 på NRH påvirket løsninger på NSA.

Prosjekt:

Nye Aker

Medvirkning i funksjonsprosjektet

Medvirkningspulje 1, Gruppe H Operasjon


1 Medvirkningsmøter

Det er gjennomført følgende møteserier i henhold til møteplaner for Gruppe H Operasjon:

Møte	Dato	
1	31.05.2023	
2	27.09.2023	

2 Endringer

Endringer i etterkant av medvirkning er listet her:

Nummer	Endring
1	<p>Endring utforming og plassering av sammedagsmottak. Endringer ble avklart i en egen serie med særmøter etter medvirkningsmøte 2.</p> <p><i>Før:</i></p>  <p><i>Etter:</i></p> <p>Sammedagsmottaket er flyttet ut av grønn sone. Flyttingen krevde en rokade av enkelt rom i grønn sone (se neste punkt).</p>



2 Som følge av flyttingen av sammedagsmottaket har enkelte rom måtte flytte på seg innenfor grønn sone.

Før:



Etter:


08.01.121 Møterom og 14.01.024 Grupperom i sør er flyttet opp mot nord der sammedagsmottaket lå før. Ved siden av har det kommet et nytt rom med flere arbeidsplasser (rom 08.01.186 Arbeidsrom, tverrfaglig). Arbeidsstasjon, kommandosentral har fått ny utforming. Medisinsk teknisk verksted er flyttet til

der venteplass, sammedagsmottak lå før og arbeidsrom har blitt plassert der Medisinsk teknisk verksted lå før i søndre korridor.



På grunn av justeringer av målene i AGV-rommet har PG måttet se på ny plassering av UF-EL-rommet og nedkast-sjakt. Dette har gitt en ny løsning på miljøstasjonen og utpakkingsrommet.

Før:

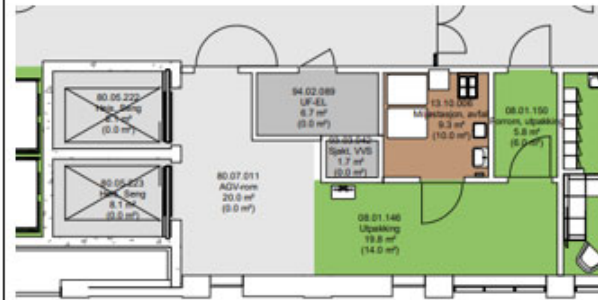

Etter:





4 Bytte av steriltlager og utstyrlager. Dette som følge av strukturelle utfordringer.




5 Før:
Plassering av 08.01.149 desinfeksjonsrom og ingen tilstøtende rent lager er programmert.




	<p>Etter:</p> <p>08.01.149 Desinfeksjonsrom og 13.07.030 Renhold har byttet plass og det har blitt plassert et lager, rent (08.01.187) ved siden av desinfeksjonsrommet i den nordlige korridoren.</p> 
--	---


6	<p>Verksted, MTA flyttet fra sørlige korridor til nordlige korridor og endret antall arbeidsplasser fra 3 stk til 5 stk.</p> <p>Før:</p>  <p>Etter:</p>
---	---

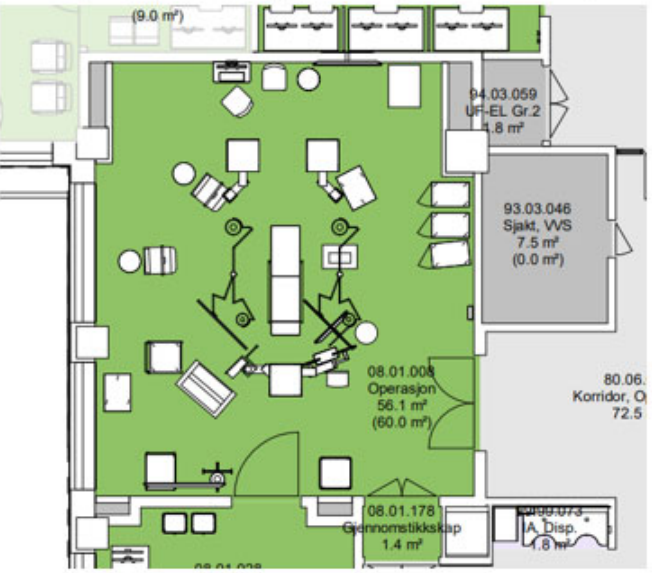

7	<p>I forbindelse med egne særmøter etter medvirkningsmøte 2 har operasjonsleien og plassering av utstyr i rom vært gjennomgått. En grundig gjennomgang ble gjennomført for å tilstrebe best mulig arbeidsflyt i rommet i henhold til anestesione og kirurgisone og pasientflyt inn/ut.</p> <p>Eksempel på planløsning i møte 2 (rom 08.01.008):</p> 
---	--

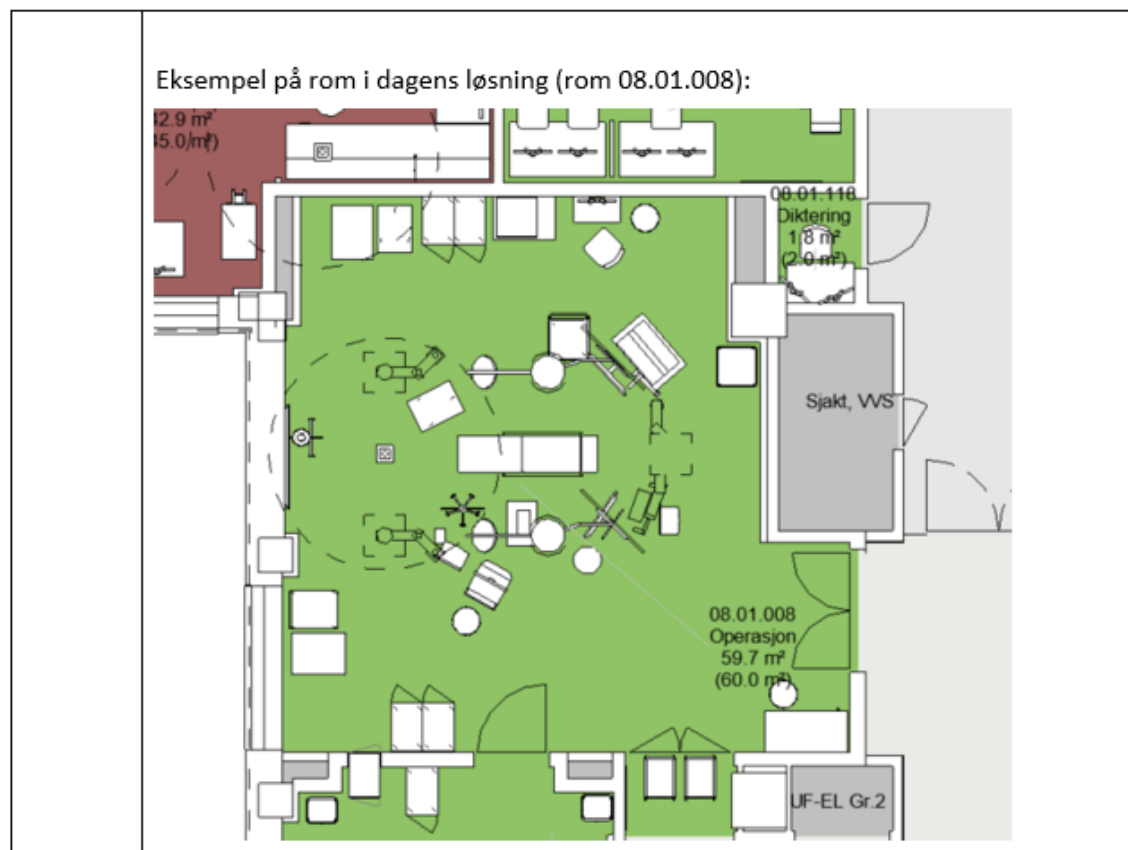

Prosjekteringen vil detaljeres ytterligere i detaljprosjekteringen for området. Dette gjelder f.eks prinsipp for sykeromskanaler og veggskinner, plassering av teknikk og utstyr på vegg og i himling. Det gjenstår noe programmering av RIKT utstyr, som skjer parallelt.

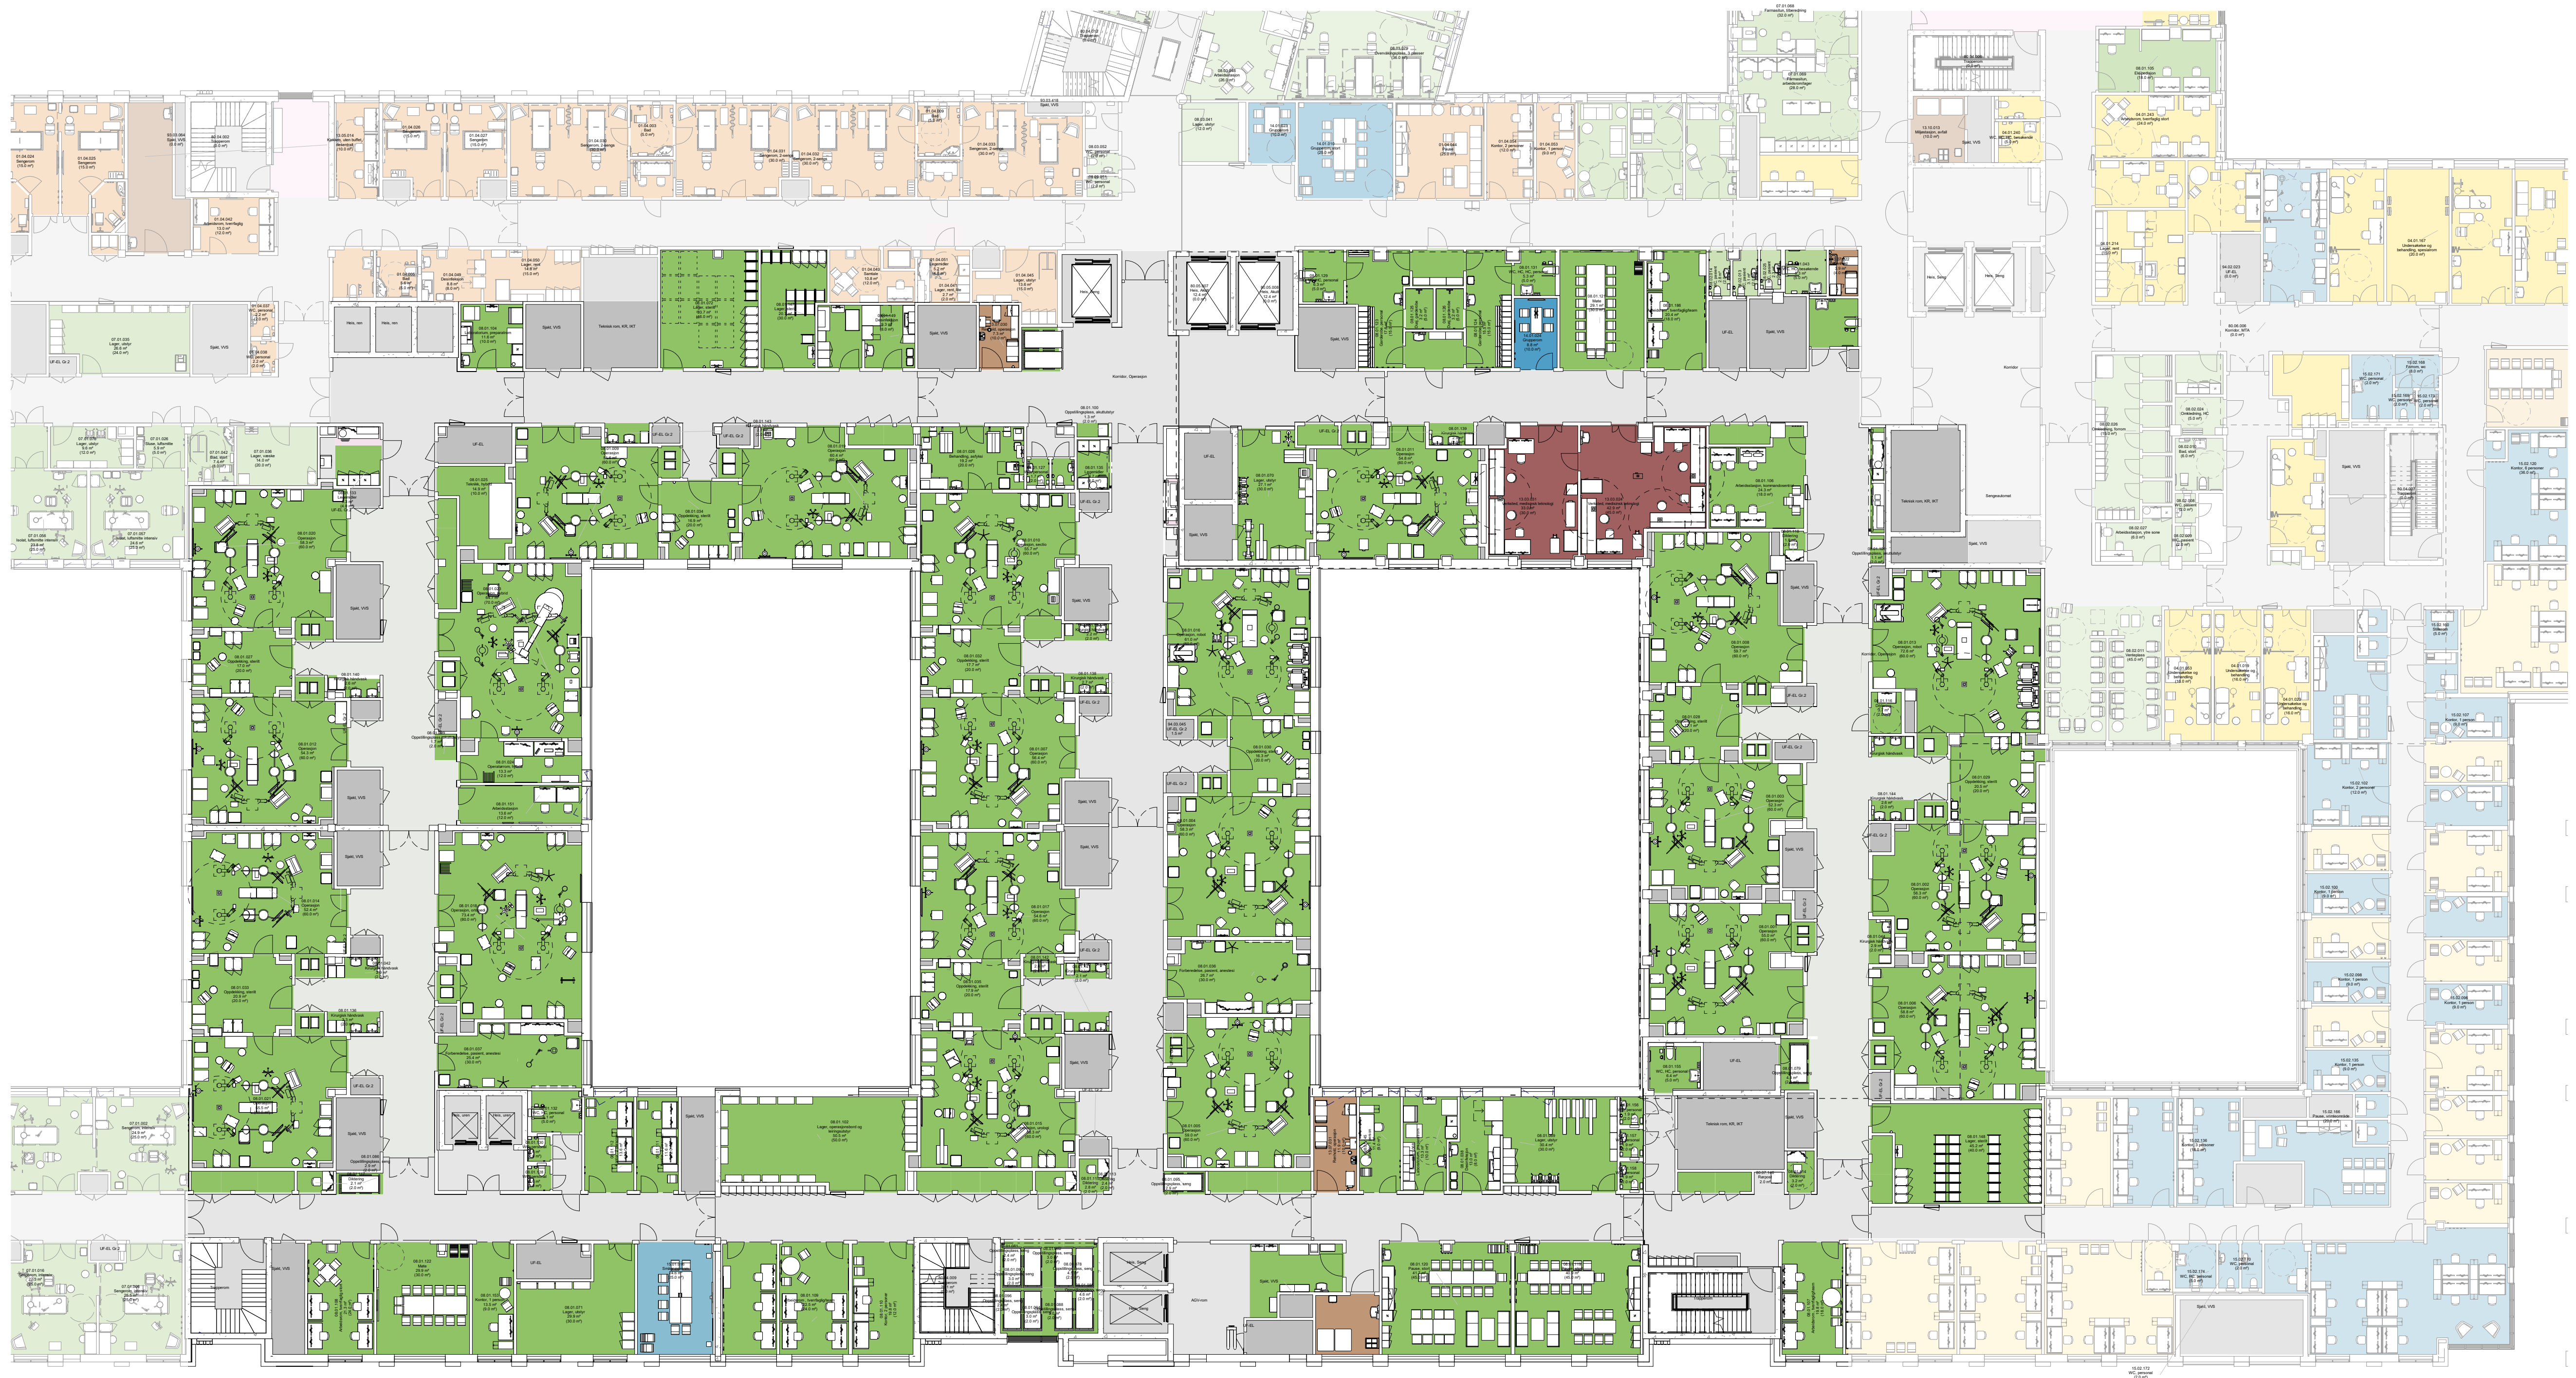

FORELØPIG TEGNING
