

NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

L - SENGEHÅNTERING



NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

L - SENGEHÅNTERING

Rom gjennomgått i møte 1 og 2, samt særmøter				
Romnr	Romnavn	Møte 1	Møte 2	Særmøter
Sengehåndtering				X*
13.08.004	Vaskerom, senger	X	X	
13.08.007	Oppstillingsplass, urene senger	X	X	
13.08.009	Vaskerom, kuvøser	X		
13.08.006	Oppstillingsplass, rene senger	X	X	
13.08.010	Sengeredning	X	X	
13.08.011	Verksted, senger	X	X	10.05.2024
13.08.001	Lager, tøy/rekvisita	X	X	
13.08.002	Lager, rent	X	X	
13.08.003	Lager, urent	X	X	
13.08.005	Lager, kuvøser	X		
<i>*Leverandørkonferanser for sengevaskemaskin ble avholdt høsten 2023</i>				

Prosjekt:

Nye Aker

Medvirkning i funksjonsprosjektet

Medvirkningspulje 1, Gruppe L

Sengehåndtering

1 Medvirkningsmøter



Det er gjennomført følgende møteserier i henhold til møteplaner for Gruppe L Sengehåndtering:

Møte	Dato	Tema
1	24.05.2024	Tema: Romfunksjonsprogram og utstyrsliste
2	19.09.2023	Tema: Flyt, og noe utstyr

2 Endringer

Endringer i etterkant av medvirkning er listet her:

Nummer	Endring
1	<p>Etter medvirkning er planløsning endret grunnet leverandørkonferanse som fant sted rett før medvirkningsmøte 2. Innspillene gitt i medvirkningsmøtene ble hensyntatt da planløsningen ble endret.</p> <p>Det er nå tegnet inn omriss av den største mulige sengevaskemaskinen, slik at alle muligheter holdes åpne frem til valg av leverandør.</p> <p>Det er fremdeles dagslys gjennom stort glasstak i <i>13.08.011 Verksted</i>, som er definert som varig arbeidsplass. Derfra spres dagslyset til omkringliggende rom (ikke definert som rom med varig opphold) gjennom store glassfelt i vegg og dører i verkstedet.</p> <p>Se hhv. gammel og ny planløsning på neste side:</p>

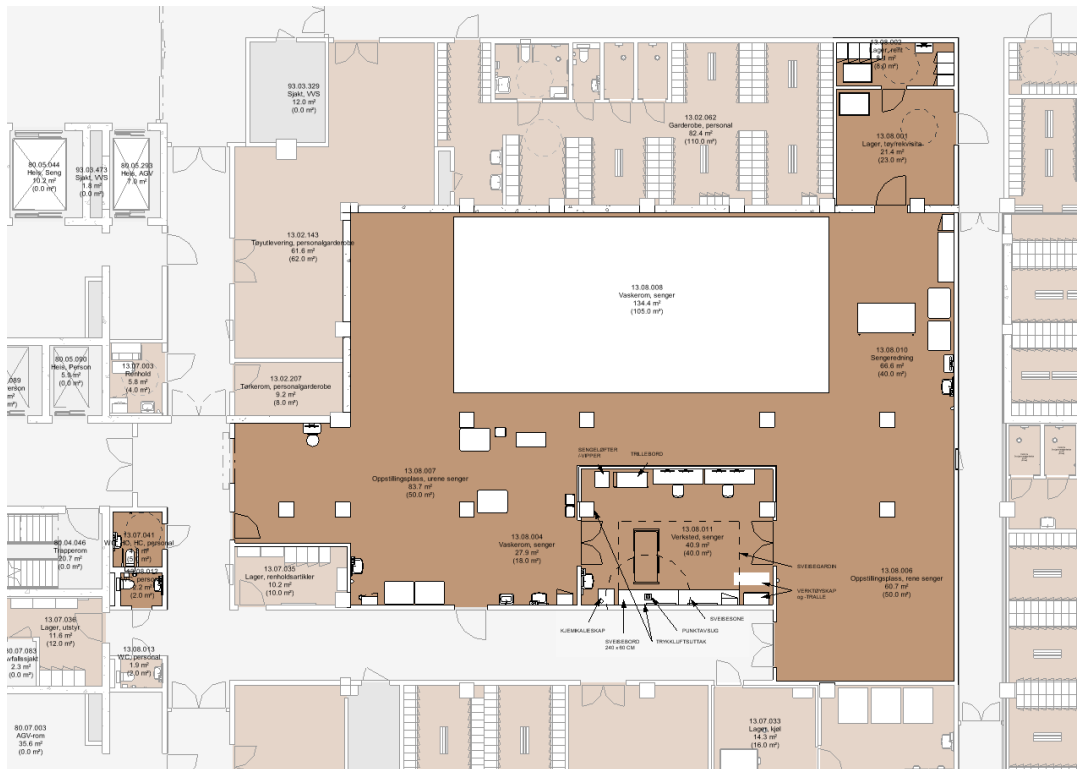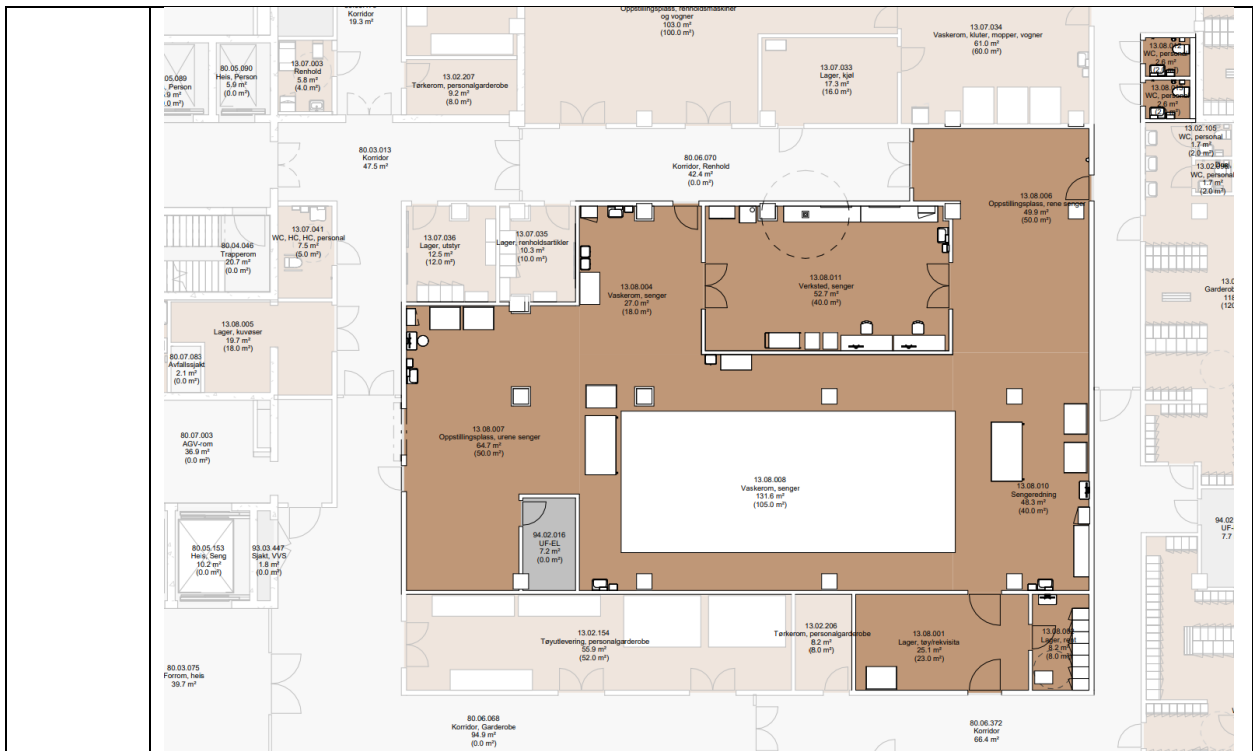


2

Vask- og tørkemaskin til vask av mikrofiberkluter ifm. manuell vask av seng flyttes fra sengevaskområdet til renholdsrom 13.07.034.

3

13.08.011 Verksted er innredet, blant annet med sveisebord, sveisegardin og sengeløfter/vipper. Det er dedikert egen sone til sveisingen innenfor sveisegardinen for å skjerme omgivelsene for sveiselys.

Denne planløsningen er diskutert med og godtatt av OUS i møte 10.05.2024.
Se skisse:

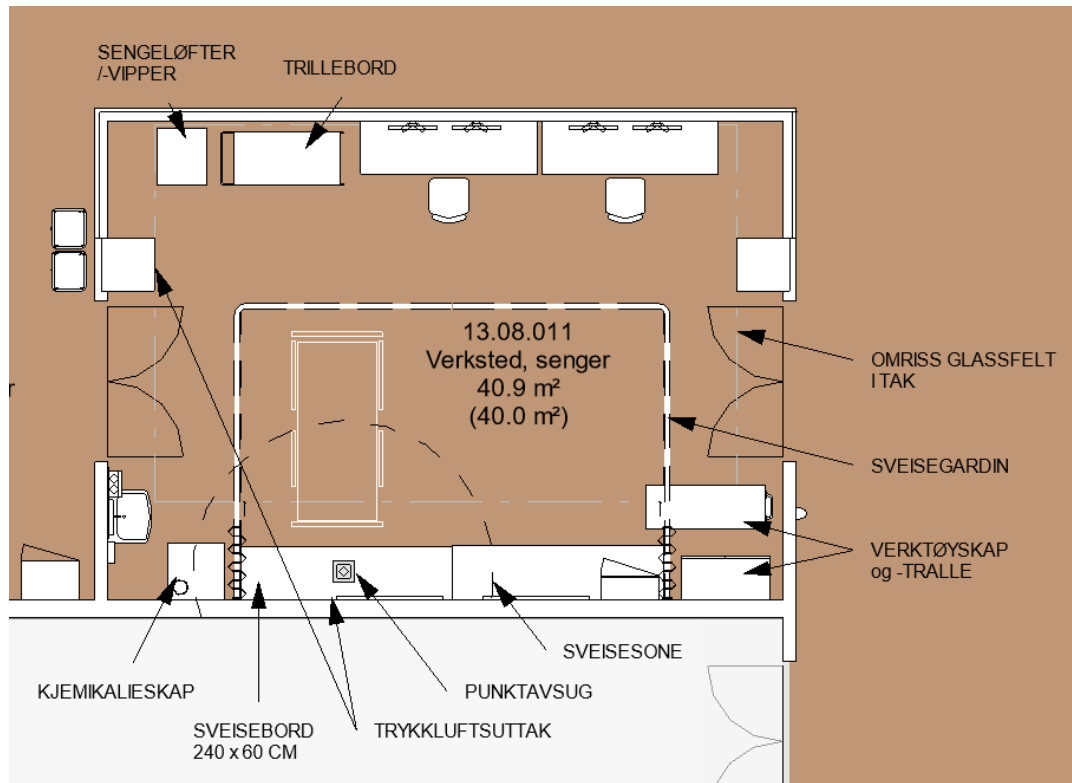


I møtet ble det også gjort justeringer i RFP:

- Antall stikk i rommet økes fra 8 til 20 230V-stikk og fra 1 til 2 400V-stikk.
- Rommet krysses av for "særskilt varmeavgivende utstyr"
- Dører markeres med avkrysning for glassfelt

I møtet gjentok OUS sitt ønske om takhengt sengeløfter fremfor mobil sengeløfter/vipper. Takhengt sengeløfter er utfordrende her på bakgrunn av det store takvinduet. OUS tar en runde internt for å vurdere den foreslåtte mobile sengeløfteren/-vipperen, og sender samtidig PO bilder av sin nåværende takhengte løsning for vurdering av mulighetsrommet for takhengt sengeløfter på Aker. Dette jobbes det videre med i detaljprosjekteringen.

4

Rom 13.08.003 Kuvøsevask lager urent har utgått fra dRofus, da rommet etter møte 2 ble slått sammen med 13.08.009 Vaskerom, kuvøser.

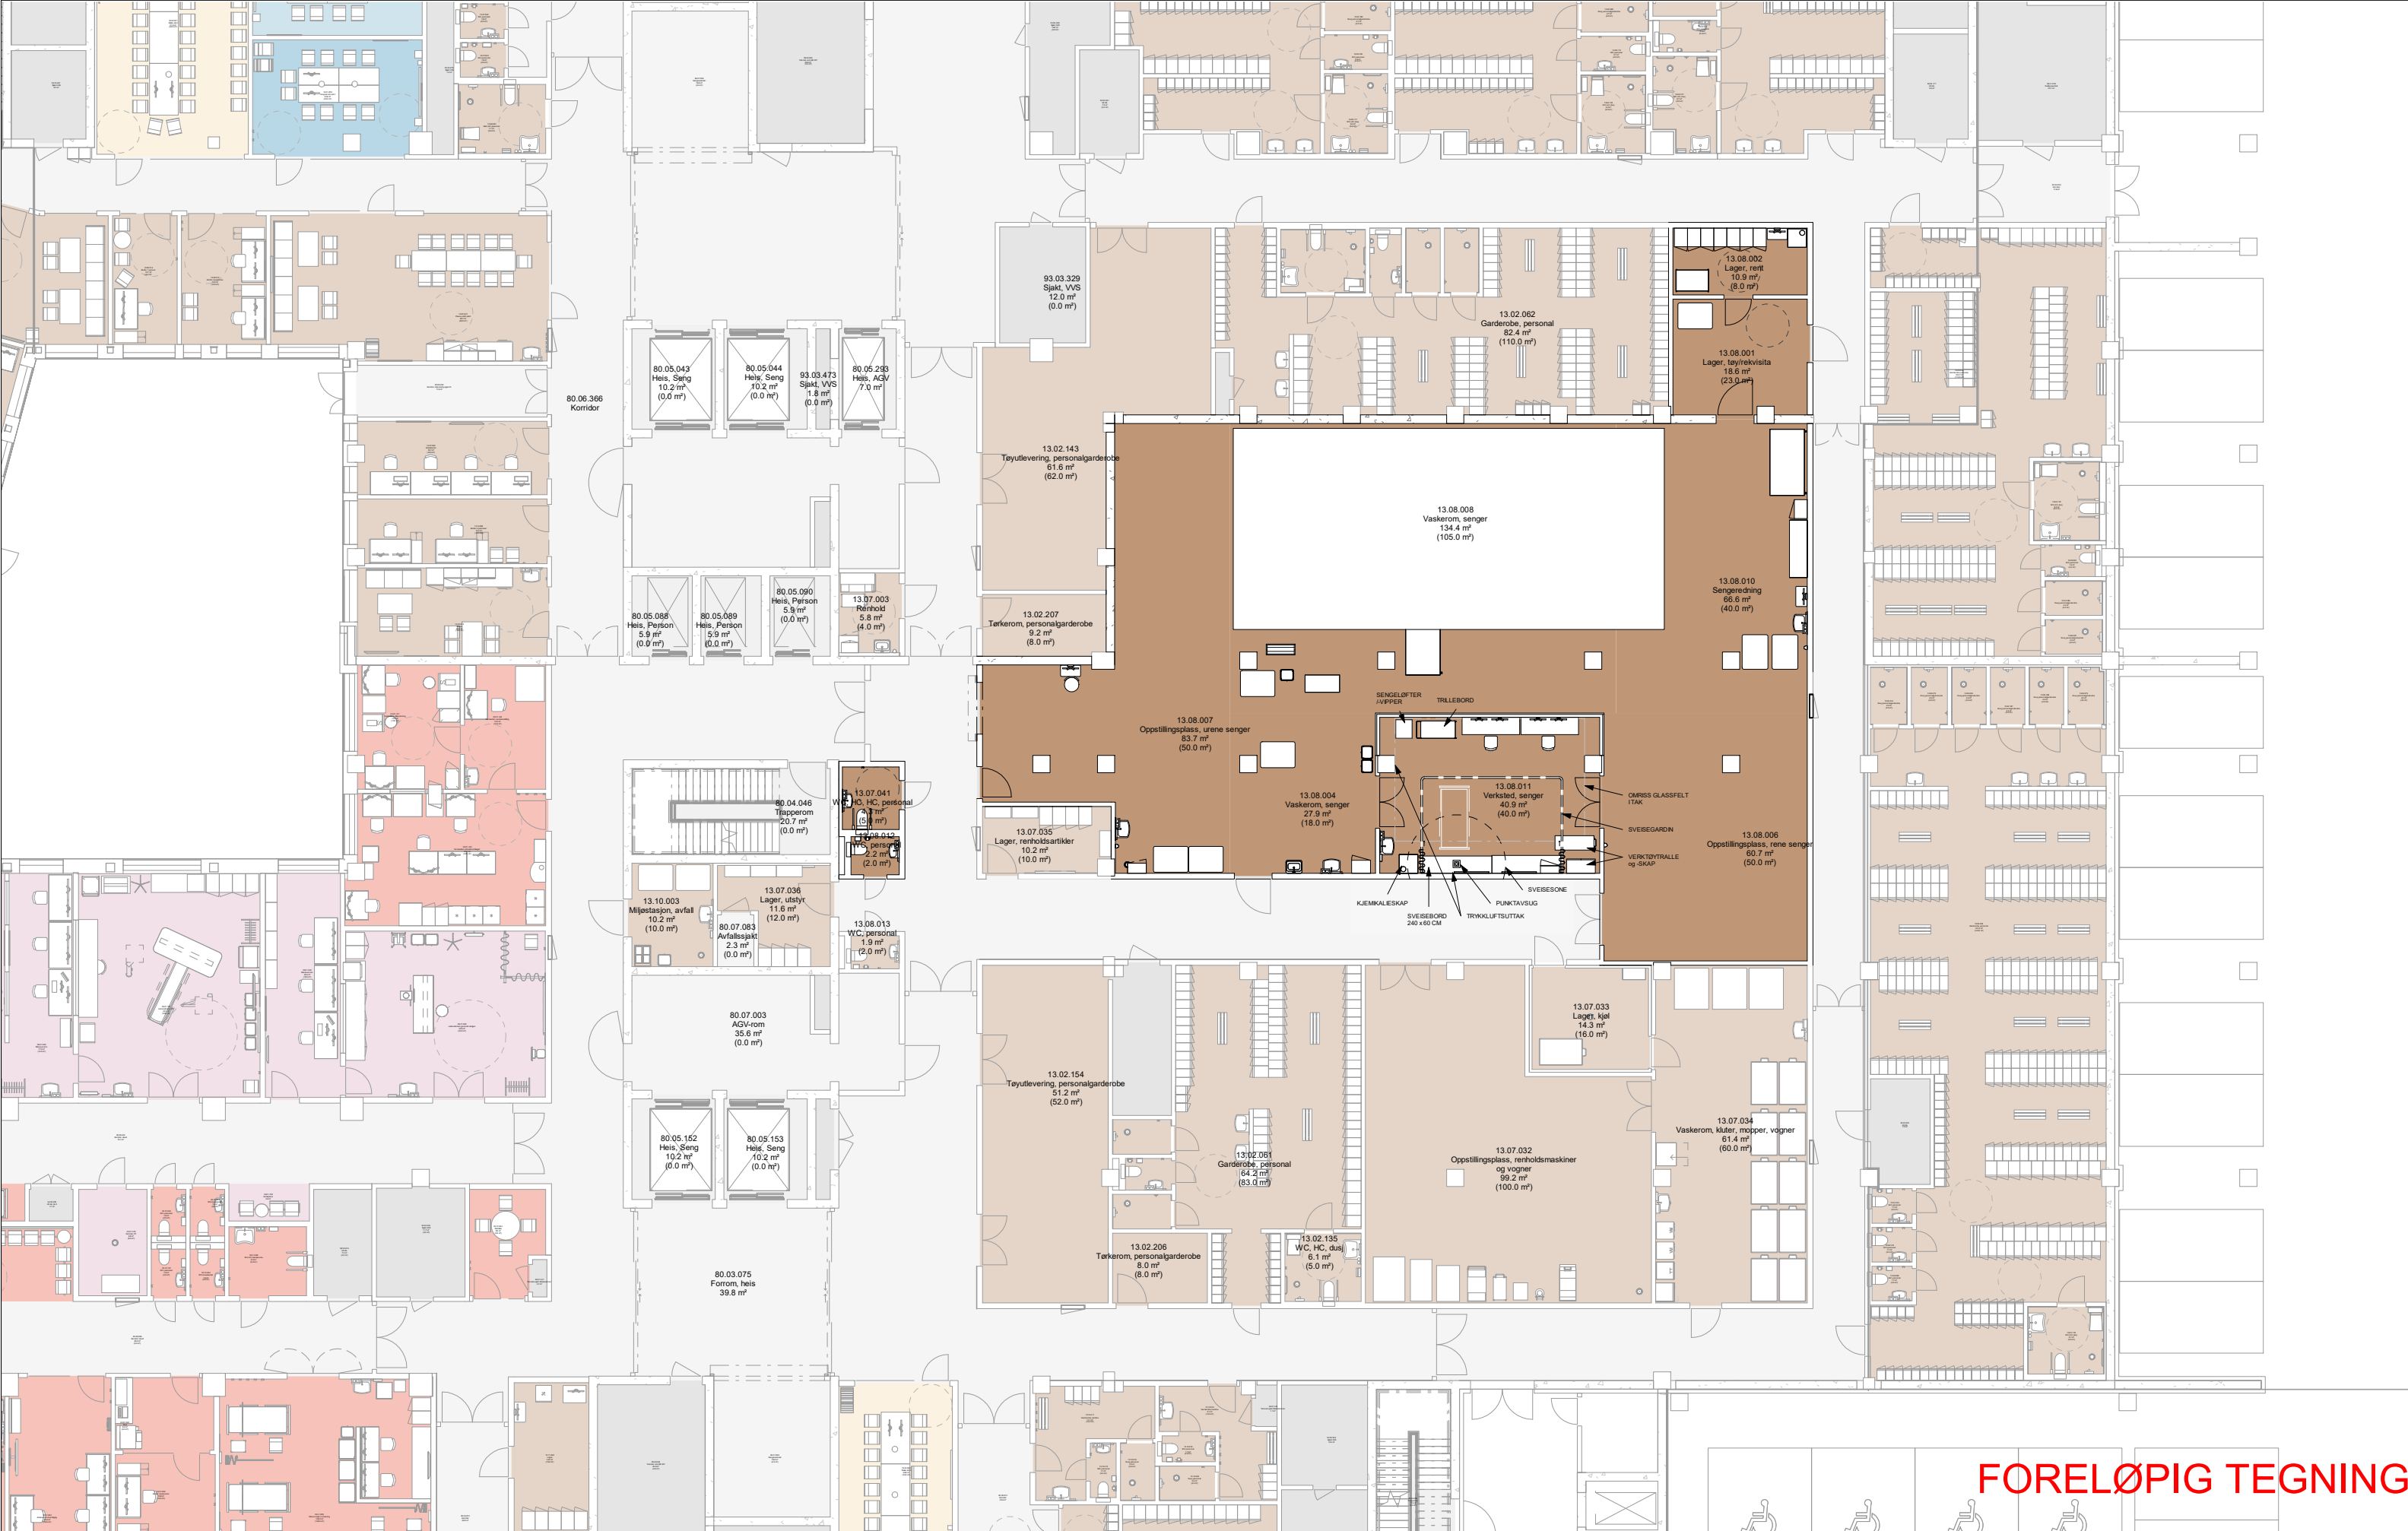

FORELØPIG TEGNING

Dato: 15.05.2024

Nye Aker

Mål: 1 : 200

AMF-L04 - Senghåndtering planutsnitt
